

SeuGado — Kauê: plano de hoje

Desbloquear a equipe e entregar satélite, clima, SAFER e estado projetado

26/09/2026

Meta do dia: terminar tudo aquilo de que os outros quatro dependem, para que amanhã eles só implementem, e entregar a sua parte (satélite, clima, SAFER e estado projetado) funcionando de verdade contra o banco real.

Ordem: primeiro o que desbloqueia a equipe (bloco A), depois o sensoriamento (bloco B), por último o teste integrado e o envio dos documentos (blocos C e D). Se o dia apertar, o bloco A é o que não pode faltar: com ele pronto, a equipe trabalha amanhã com as fixtures mesmo que o seu bloco B termine de madrugada.

0. Atualização de 27/09 (ADR-025): faça isto primeiro

A revisão do fluxo mudou o produto. Estado das suas specs:

Spec	Situação	Ordem
SPEC-007 a 010, 014A	feitas	—
SPEC-015 admin, agenda, categorias com sexo, status do plano, contratos novos	nova	1ª (desbloqueia a equipe)
SPEC-016 painel admin: seletor de fazenda, página Clientes, tipos TS	nova	2ª (desbloqueia a equipe)
SPEC-011 clima	igual	3ª
SPEC-012 SAFER	igual	4ª
SPEC-013 satélite	reescrita: Sentinel-2 a 10 m + Cloud Score+ (piquetes de 0,1–0,5 ha)	5ª
SPEC-014 estado projetado	igual (completa o estado.py)	6ª

O que muda para a equipe (documentos já atualizados):

- **Leandro:** painel **só de admin** (clientes e fazendas, sem onboarding), mão de obra em animais, envio no dia e hora do produtor, rotina de hora em hora (diária + semanal + candidato).
- **Leo:** sem confirmação por omissão (lembrete diário), plano candidato (“ver mudanças / manter / trocar”) e `/alturas` para o produtor corrigir e recalcular.
- **João:** capacidade em animais, destino “mais passado do ponto”, alertas `passando_do_ponto` e `sem_dia_de_manejo`, `comparar_planos` e planos com status.
- **Ezequiel:** só Marandu rotacionado, altura inicial obrigatória, sem a tela de “altura que falta”.

Prompts para o Muse:

Implement specs/SPEC-015-admin-agenda-categorias.md. Read only that spec and the files it lists. Do not apply the migration yourself. Update your own tests only where the spec changes behaviour; do

```
not touch tests/conformance/. At the end run `uv run ruff check .`, `uv run mypy` and `uv run --env-file .env pytest` and report. No new dependencies.
```

```
Implement specs/SPEC-016-web-admin.md. Read only that spec and the files it lists. Copy the R1 TypeScript declarations verbatim. Do not implement page content. At the end run `npm run build` inside frontend/ and report. No new dependencies.
```

Depois de cada uma: Teste com revisoes/KIT-ACEITE-015.md (ou 016), aplique db/migrations/0003_admin_agenda.sql no Supabase (só na 015), ajuste as suítes de conformidade antigas afetadas (mudança intencional, ADR-025) e commite.

No Supabase (manual):

- *Authentication* → *Sign In / Providers*: desligue “Allow new users to sign up”.
- *Authentication* → *Users* → *Add user*: crie as 5 contas da equipe e mande a cada um o e-mail e a senha.

1. O que foi decidido hoje

Tudo abaixo já está registrado em docs/12-REGISTRO-DE-DECISOES-ADR.md (ADRs 022, 023 e 024) e os números novos já estão no docs/05-PARAMETROS-CULTIVARES.md.


Decisão	Em uma frase	ADR
Divisão da equipe	Cada pessoa é dona de arquivos específicos; ninguém edita arquivo de outro	022
Contratos fixos	src/seugado/contratos.py + frontend/src/lib/tipos.ts + duas fixtures JSON são a “API entre pessoas”	022
Escrita por evento	Cadastro e respostas do bot viram evento → reconstruir_projecao → commit; as telas leem as tabelas derivadas	022
Fazenda é configuração	A tabela fazenda (funcionários, dias preferenciais, Telegram) é editada por UPDATE, não por evento	022
Infra	Supabase (banco + login) · Render (API) · Vercel (site) · GitHub Actions (ciclo semanal) · Telegram por webhook	022
Âncora do estoque	O estoque de capim parte da altura medida com régua ; o satélite e o clima dão só a taxa de crescimento	023
Evento novo	altura_medida (cadastro, bot ou web)	023
Leitura de satélite	Guarda a observação (NDVI, vermelho, infravermelho, nuvem, pixels), não massa	023
Fontes de dados	HLS no Earth Engine + Open-Meteo (histórico, previsão de 16 dias, ET _o pronta)	023
Validação no MVP	O bot pede altura medida com régua ; a foto fica para depois	023
Ciclo semanal	Segunda 05:00, movimentações só em dia preferencial, recálculo quando o produtor diverge	024
Otimizador	Guloso semanal, simulado dia a dia; fallback: piquete a ≥ 90% da altura de entrada, senão alerta	024
Distância	Haversine entre centroides, em Python (a tabela PostGIS volta com o CP-SAT)	024
Cultivar do MVP	Só o Marandu está completo; as outras aparecem como “aguardando parâmetro”	024

2. Pesquisas feitas hoje

Parâmetro	Valor	Fonte	Confiança
RUE (eficiência de uso da radiação) de <i>B. brizantha</i>	2,31 g/MJ	Almeida et al. (2023), <i>Remote Sensing</i> 15(3):815, SAFER aplicado à Piatã	baixa para Marandu (mesma espécie, outra cultivar)
Temperatura base do Marandu	15,0 °C	Mendonça, Rassini & Villa Nova (2005), Embrapa Pecuária Sudeste	média
Temperatura base do Tanzânia	15,0 °C	idem	média
Temperatura base da <i>B. decumbens</i>	16,7 °C	idem	média
Marandu rotacionado: entrada / saída	30 / 15 cm	Andrade (2008), Embrapa Acre, via Soares et al. (2021)	média
Albedo no SAFER	$\alpha = 0,08 + 0,41 \cdot \rho_{\text{vermelho}} + 0,14 \cdot \rho_{\text{NIR}}$	Teixeira et al. (Embrapa), bandas vermelho/NIR	—
Radiação de onda longa (Slob)	$a_L = 6,99 \cdot T_a - 39,93$	Teixeira et al. (2010, 2012), via Ramos (UNIVASF)	—
Temperatura no ETf	em °C (em kelvin o ETf dá ≈ 0)	verificação numérica da equação	—
Radiação no topo da atmosfera	FAO-56, eq. 21	Allen et al. (1998)	—
HLS no Earth Engine	HLSS30 atualizado até 24/09/2026; HLSL30 parado em 15/10/2025	catálogo do GEE	—
Clima	Open-Meteo: previsão com <code>past_days=92</code> e <code>forecast_days=16</code> ; histórico ERA5 com atraso de ~5 dias; ET ₀ FAO-56 pronta	documentação Open-Meteo	—

Com isso, o Marandu fica com todos os parâmetros: densidade 110, eficiência 0,72, RUE 2,31, temperatura base 15, entrada/saída 30/15 e contínuo 35/20. As demais cultivares não têm densidade nem RUE com fonte. Elas entram no catálogo e aparecem no mapa, mas sem estimativa. **Na demo, use Marandu.**

3. Como os módulos se conectam

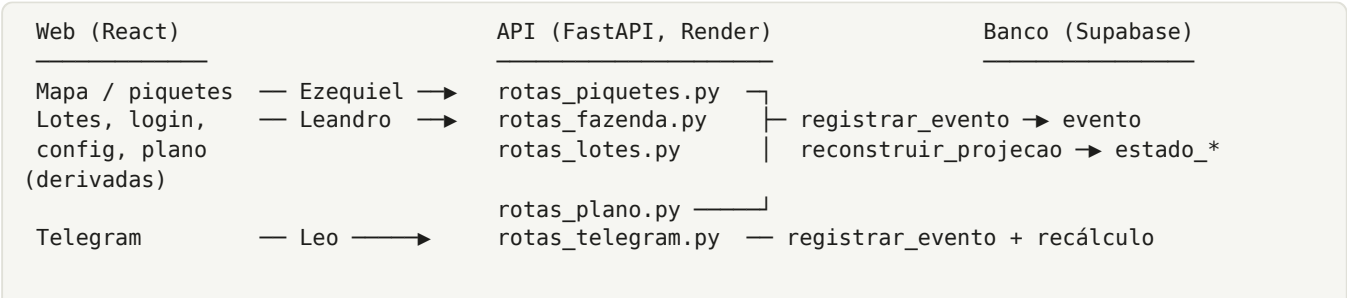

Rotina (jobs/ciclo.py – Leandro), de hora em hora via GitHub Actions:
diária (06h local): lembrar_pendentes (Leo) → ingerir_leituras (KAUÊ, Sentinel-2)
→ reconstruir_projecao (KAUÊ) → montar_estado_projetado (KAUÊ)
→ gerar_plano (João) → comparar_planos (João)
→ se mudou: salvar_plano(candidato) (João) + avisar_plano_candidato (Leo)
semanal (dia/hora do produtor): mesma cadeia → salvar_plano(vigente) → enviar_plano (Leo)
recálculo (bot ou painel): executar_ciclo sem satélite → vigente → enviar_plano(atualizado)

Os tipos que atravessam as setas estão em `src/seugado/contratos.py` (SPEC-009):

`EstadoProjetado` sai de você e entra no João; `PlanoManejo` sai do João e entra no Leo, no Leandro (página do plano) e no Ezequiel (cores do mapa).

Arquivos por dono (ninguém edita o arquivo de outro)

Dono	Arquivos
Kauê	<code>db/migrations/*</code> , <code>core/*</code> , <code>persistencia/eventos.py</code> , <code>persistencia/projecao_db.py</code> , <code>persistencia/catalogo.py</code> , <code>contratos.py</code> , <code>sensing/*</code> , <code>planner/estado.py</code> , <code>planner/carga.py</code> , <code>api/main.py</code> , <code>api/deps.py</code> , <code>api/auth.py</code> , <code>pyproject.toml</code> , <code>uv.lock</code> , <code>frontend/package.json</code> , <code>frontend/src/lib/*</code> , <code>frontend/src/componentes/*</code> , <code>frontend/src/App.tsx</code> , <code>tests/fixtures/*</code>
Ezequiel	<code>api/rotas_piquetes.py</code> , <code>cadastro/piquetes.py</code> , <code>frontend/src/paginas/Mapa.tsx</code> , <code>frontend/src/componentes/mapa/*</code> , <code>tests/cadastro/test_piquetes.py</code>
João	<code>planner/otimizador.py</code> , <code>planner/confianca.py</code> , <code>planner/geo.py</code> , <code>planner/comparacao.py</code> , <code>persistencia/planos.py</code> , <code>tests/planner/test_otimizador.py</code> , <code>tests/planner/test_confianca.py</code> , <code>tests/persistencia/test_planos.py</code>
Leandro	<code>api/rotas_fazenda.py</code> , <code>api/rotas_lotes.py</code> , <code>api/rotas_plano.py</code> , <code>cadastro/fazenda.py</code> , <code>cadastro/clientes.py</code> , <code>cadastro/lotes.py</code> , <code>jobs/ciclo.py</code> , <code>.github/workflows/*</code> , <code>render.yaml</code> , <code>frontend/src/paginas/{Login,Clientes,Configuracoes,Lotes,Plano}.tsx</code> , <code>frontend/src/estilo/*</code> , <code>tests/cadastro/test_fazenda.py</code> , <code>tests/cadastro/test_lotes.py</code> , <code>tests/jobs/*</code>
Leo	<code>delivery/*</code> , <code>api/rotas_telegram.py</code> , <code>scripts/telegram_polling.py</code> , <code>tests/delivery/*</code>

Se alguém precisar de dependência nova ou mudar contrato, pede a você. Você decide aqui comigo.

4. Passo a passo de hoje

Bloco 0 — Contas e chaves (manual, ~40 min)

0.1 Supabase (banco + login)

1. Em `supabase.com`, crie o projeto `seugado` na região **South America (São Paulo)**. Anote a senha do banco.
2. Em *Project Settings* → *Data API*, copie a **Project URL** (`SUPABASE_URL`) e a chave **anon / publishable** (`SUPABASE_ANON_KEY`).
3. Em *Connect*, copie a string do **Session pooler** (porta 5432). Ela é o `DATABASE_URL`. Não use a *Direct connection*: no plano grátis ela é só IPv6, e o Render e o GitHub Actions não alcançam. Não use o *Transaction pooler* (6543): ele quebra os prepared statements do `psycpg`.

4. Em *Authentication* → *Sign In / Providers* → *Email*, desligue **Confirm email**. Na demo, ninguém vai conseguir esperar e-mail de confirmação.

0.2 Google Earth Engine (satélite)

1. Em `console.cloud.google.com`, crie o projeto `seugado-gee` (anote o **Project ID**: ele é o `SEUGADO_GEE_PROJECT`).
2. Em `code.earthengine.google.com/register`, registre esse projeto para **uso não comercial** (acadêmico). A aprovação costuma ser imediata.
3. Ative a **Earth Engine API** no projeto (*APIs e serviços* → *Biblioteca*).
4. Em *IAM* → *Contas de serviço*, crie `seugado-ingestao`, dê os papéis **Earth Engine Resource Viewer** e **Service Usage Consumer**, e gere uma **chave JSON**. O conteúdo do arquivo é o `SEUGADO_GEE_SERVICE_ACCOUNT_JSON`.

0.3 Arquivo `.env local` (fora do Git; o `.gitignore` já ignora `.env`; confira)

Preencha `DATABASE_URL`, `SEUGADO_TEST_DATABASE_URL` (pode ser o mesmo banco hoje), `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `SEUGADO_GEE_PROJECT` e `SEUGADO_GEE_SERVICE_ACCOUNT_JSON`. As do Telegram ficam para o Leo.

Bloco A — Desbloquear a equipe (obrigatório hoje)

Cada spec já está pronta em `specs/`, com o kit de aceite em `revisoes/`. O ciclo é o de sempre (`docs/08 §7`).

A1. SPEC-007: eventos do MVP. Adiciona `OrigemPeso`, o evento `altura_medida`, geometria no piquete, leitura de satélite como observação, divergência que move o lote e `combinar_confianca`. Ação manual: Abra o Muse Code e peça para implementar `specs/SPEC-007-eventos-mvp.md`. Quando ele terminar, chame o Antigravity para testar com `revisoes/KIT-ACEITE-007.md` e `commitar`. Avise o Antigravity de que os testes de conformidade 005 e 006 precisam ser ajustados ao novo formato de `leitura_satelite`. É mudança intencional (ADR-023), não regressão.

A2. SPEC-008: banco do MVP. Migração `0002_mvp.sql` (fazenda completa, usuário↔fazenda, catálogo com 9 cultivares, derivadas completas, `plano`, `telegram_conversa`, RLS), `reconstruir_projecao` e o catálogo com overrides. Ação manual: Abra o Muse Code e peça para implementar `specs/SPEC-008-banco-mvp.md`. Depois peça ao Antigravity para aplicar `0001` e `0002` no Supabase (SQL Editor), testar com `revisoes/KIT-ACEITE-008.md` e `commitar`.

A3. SPEC-009: contratos. `contratos.py`, com os tipos e a conversão para JSON. As duas fixtures já estão em `tests/fixtures/` e a spec exige que elas carreguem. Ação manual: Abra o Muse Code e peça para implementar `specs/SPEC-009-contratos.md`. Quando ele terminar, chame o Antigravity para testar com `revisoes/KIT-ACEITE-009.md` e `commitar`.

A4. SPEC-010: esqueleto da API e do site. Antes do Muse, o Antigravity cria o frontend e instala as dependências. Ação manual: Peça ao Antigravity para criar `frontend/` com o template `Vite "react-ts"`, instalar `react-router`, `@supabase/supabase-js`, `leaflet`, `react-leaflet`, `@geoman-io/leaflet-geoman-free` e `@types/leaflet` (dev), e adicionar ao `pyproject fastapi`, `uvicorn[standard]`, `httpx` e `earthengine-api`, com override do `mypy ignore_missing_imports` para o módulo `"ee"`. Ação manual: Depois, abra o Muse Code e peça para implementar `specs/SPEC-010-esqueleto-api-frontend.md`. Por fim, o Antigravity testa com `revisoes/KIT-ACEITE-010.md` e `commita`.

A4b. SPEC-014A: auxiliares do estado (antes de mandar os documentos). Cria `planner/estado.py` só com as funções que o João (`avancar_massa_um_dia`) e o Leandro (`peso_por_ua_kg`) importam. É pequena e pura. A SPEC-014 completa, amanhã, acrescenta o resto no mesmo arquivo. Ação manual: Abra o Muse Code e peça para implementar `specs/SPEC-014A-estado-auxiliares.md`. Quando ele terminar, chame o Antigravity para testar com `revisoes/KIT-ACEITE-014A.md` e `commitar`.

A5. Conferência do bloco A. A API sobe e `GET /saude` responde. `npm run build` passa. O banco tem 9 cultivares. `tests/fixtures/*.json` carregam em `contratos.py`. Deste ponto em diante, **ninguém da equipe fica bloqueado por você**.

Bloco B — Sua implementação

B1. SPEC-011: clima (Open-Meteo). Radiação no topo da atmosfera, graus-dia e cliente de histórico e previsão. Ação manual: Abra o Muse Code e peça para implementar `specs/SPEC-011-clima.md`. Quando ele terminar, chame o Antigravity para testar com `revisoes/KIT-ACEITE-011.md` e `commitar`.

B2. SPEC-012: SAFER. A cadeia de 11 equações, pura, com as faixas de sanidade. Ação manual: Abra o Muse Code e peça para implementar `specs/SPEC-012-safer.md`. Quando ele terminar, chame o Antigravity para testar com `revisoes/KIT-ACEITE-012.md` e `commitar`.

B3. SPEC-013: satélite HLS. Amostragem por piquete no Earth Engine e ingestão idempotente. Ação manual: Abra o Muse Code e peça para implementar `specs/SPEC-013-satelite-hls.md`. Quando ele terminar, chame o Antigravity para testar com `revisoes/KIT-ACEITE-013.md` e `commitar`.

B4. SPEC-014: estado projetado. Estoque de hoje e crescimento dos próximos 14 dias. Ação manual: Abra o Muse Code e peça para implementar `specs/SPEC-014-estado-projetado.md`. Quando ele terminar, chame o Antigravity para testar com `revisoes/KIT-ACEITE-014.md` e `commitar`.

Bloco C — Teste integrado da sua parte

O objetivo é ver, no banco real, o estado projetado de uma fazenda de verdade.

- Desenhe 2 ou 3 piquetes de uma área de pasto real (pode ser em `geojson.io`) e guarde os polígonos.
- Peça ao Antigravity um script descartável em `scripts/` que:
 - cria uma fazenda de teste e o vínculo com o seu usuário do Supabase;
 - registra `piquete_criado` (Marandu, rotacionado, com a geometria);
 - registra `altura_medida` de cada piquete;
 - roda `reconstruir_projecao` e `commit`;
 - roda `ingerir_leituras` dos últimos 30 dias e `commit`;
 - roda `reconstruir_projecao` de novo;
 - imprime `estado_para_dict(montar_estado_projetado(conn, fazenda_id, hoje))`.
- Critério de pronto:** cada piquete sai com `massa_hoje_kg_ms_ha`, 14 taxas entre 0 e 150 kg/ha/dia e `faltantes` vazio. Se aparecer `estimativa_invalida`, a mensagem de erro do SAFER diz qual variável saiu da faixa. Traga a mensagem aqui num chat [TRIAGEM].
- Guarde o id da fazenda de teste.** O João e o Leo vão usar esse estado real na segunda.

Bloco D — Entregar os documentos

1. Os documentos de cada pessoa já estão em `docs/equipe/` (md e pdf). Eles descrevem tudo como disponível, porque você só vai enviar depois de terminar os blocos A a C.
2. Mande as chaves **por mensagem privada, nunca pelo Git**:
 - Ezequiel, João e Leandro: `DATABASE_URL`, `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_ANON_KEY`.
 - Leandro: também as do Earth Engine, porque ele configura o deploy e o GitHub Actions.
 - Leo: `DATABASE_URL` (ele cria o próprio bot e o token).
3. Mande a cada um o próprio PDF e o caminho do md no repositório.

5. Checklist antes de enviar

- [] SPEC-007 a SPEC-010 commitadas; `uv run --env-file .env pytest verde`
- [] Migrações 0001 e 0002 aplicadas no Supabase; `SELECT count(*) FROM cultivar = 9`
- [] `uv run --env-file .env uvicorn seugado.api.main:app --app-dir src sobe; /saude responde`
- [] `cd frontend && npm run build` passa
- [] SPEC-011 a SPEC-014 commitadas
- [] Teste integrado do bloco C com massa e taxas plausíveis
- [] `git push` feito; branch `main` atualizada
- [] Chaves enviadas em privado

6. Segunda e terça

- **Segunda (reunião)**: cada um abre um PR da sua branch; a ordem de merge é Ezequiel → Leandro (lotes/fazenda) → João → Leo → Leandro (ciclo e deploy). Depois, rode o ciclo completo com a fazenda de teste e o bot de verdade.
- **Terça (demo)**: mostre o mapa com as cores do plano, a página “Plano da semana” e o Telegram recebendo o plano. Depois, responda “fiz diferente” e mostre o plano recalculado.

Se algo do satélite ou do clima falhar na segunda, o [TRIAGEM] é aqui, com o erro e a linha `Leia: docs/11, specs/SPEC-0NN`, o arquivo citado.
